



**ASL Salerno**  
Azienda Sanitaria Locale Salerno



## **PIANO MIRATO DI PREVENZIONE Linea PP07**

*"Prevenzione in Edilizia e Agricoltura"*



### ***LISTE DI AUTOVALUTAZIONE E DI CONTROLLO AZIENDALE PER IL SETTORE EDILIZIA***

*Azione di supporto per il settore edile della Provincia di Salerno*

*In collaborazione con:*



## **SOMMARIO**

### **SCHEDA DI INTRODUZIONE:**

**SCHEDA N. 1: IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE**

**SCHEDA N. 2: ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA**

### **SCHEDA GENERALI:**

**SCHEDA N. 3A: IMPRESA CON RUOLO DI AFFIDATARIA**

**SCHEDA N. 3B: IMPRESA CON RUOLO DI ESECUTRICE**

**SCHEDA 3C: LAVORATORE AUTONOMO**

### **SCHEDA SPECIFICHE:**

**SCHEDA N. 4: *USO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO***

**SCHEDA N. 5: *DPI ANTI-CADUTA DA UTILIZZARE DURANTE IL MONTAGGIO DEL PONTEGGIO***

**SCHEDA N. 6: *LISTA DI AUTOVALUTAZIONE PER IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DURANTE L'USO DEL PONTEGGIO PER IL LAVORATORE AUTONOMO***




**SCHEDA N. 1: INTRODUZIONE**


<b>CANTIERE</b>	
INDIRIZZO DEL CANTIERE	
NOTIFICA PRELIMINARE (N. IDENTIFICATIVO)	
<b>COMMITTENTE</b>	
NOMINATIVO	
RESIDENZA/DOMICILIO	
EMAIL E PEC	
CELLULARE	
<b>RESPONSABILE DEI LAVORI</b>	
NOMINATIVO	
RESIDENZA/DOMICILIO	
EMAIL E PEC	
CELLULARE	
<b>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b>	
NOMINATIVO	
RESIDENZA/DOMICILIO	
EMAIL E PEC	
CELLULARE	
<b>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</b>	
NOMINATIVO	
RESIDENZA/DOMICILIO	
EMAIL E PEC	
CELLULARE	
<b>IMPRESA O LAVORATORE AUTONOMO</b>	
RAGIONE SOCIALE	
PARTITA IVA	
SEDE LEGALE	
EMAIL E PEC	
CARATTERISTICHE AZIENDALI (barra con una X)	
NUMERO LAVORATORI ≥ 10	<input type="checkbox"/>
NUMERO LAVORATORI < 10	<input type="checkbox"/>
IMPRESA FAMILIARE (OVVERO IMPRESA INDIVIDUALE CON COLLABORATORI FAMILIARI)	<input type="checkbox"/>
LAVORATORE AUTONOMO (OVVERO IMPRESA INDIVIDUALE SENZA LAVORATORI NÈ SOCI)	<input type="checkbox"/>

SCHEDA N. 2: ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

ORGANIGRAMMA SICUREZZA CANTIERE CON UNA SOLA IMPRESA  
AFFIDATARIA

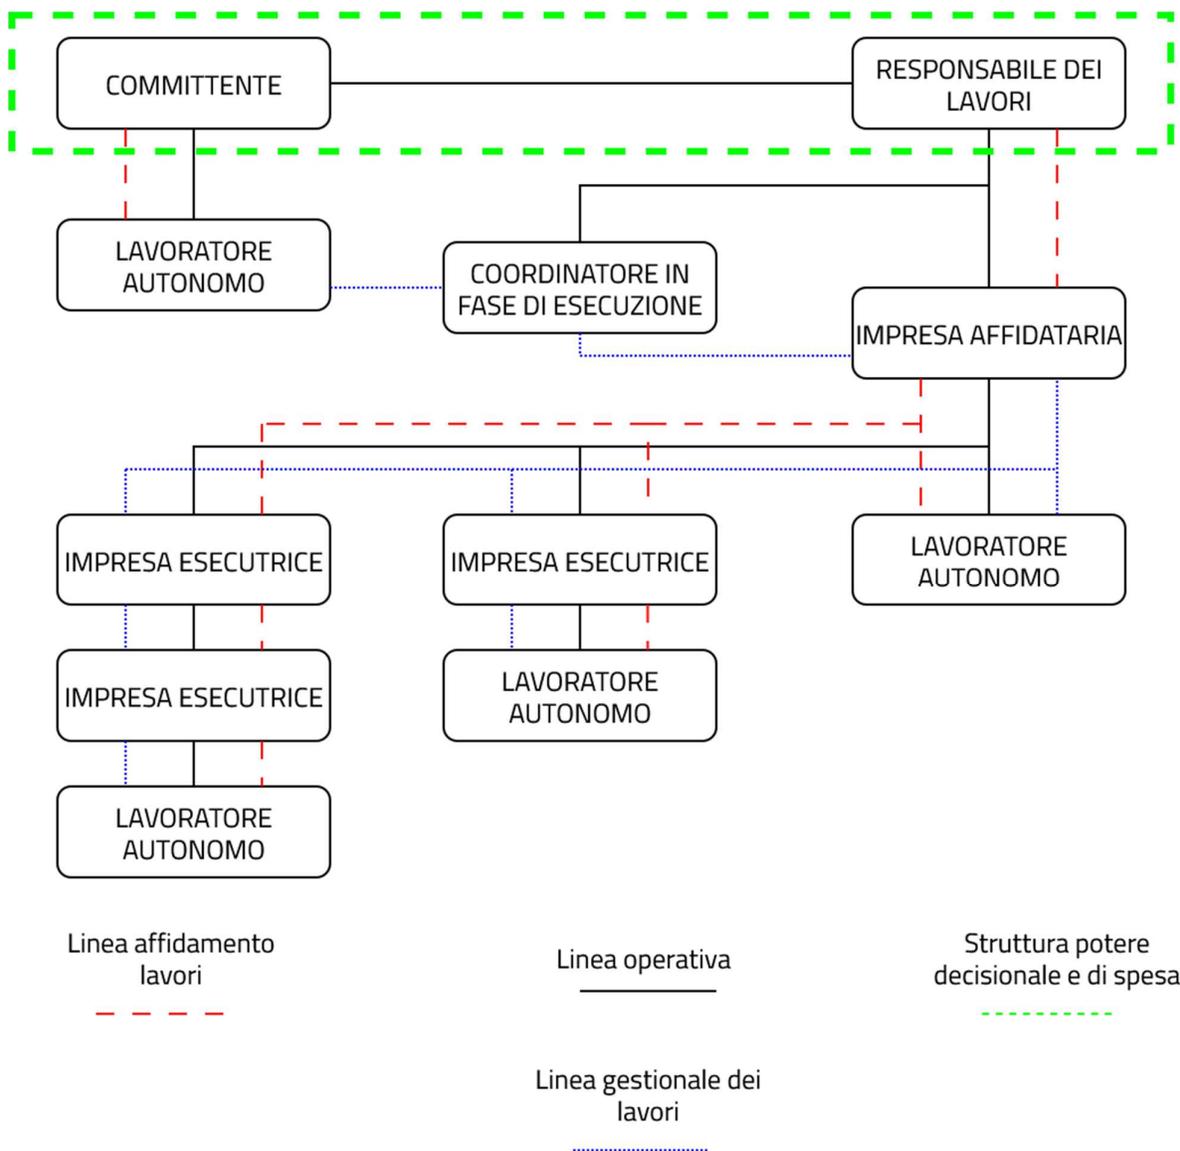

ORGANIGRAMMA SICUREZZA CANTIERE CON PIU' IMPRESE AFFIDATARIE

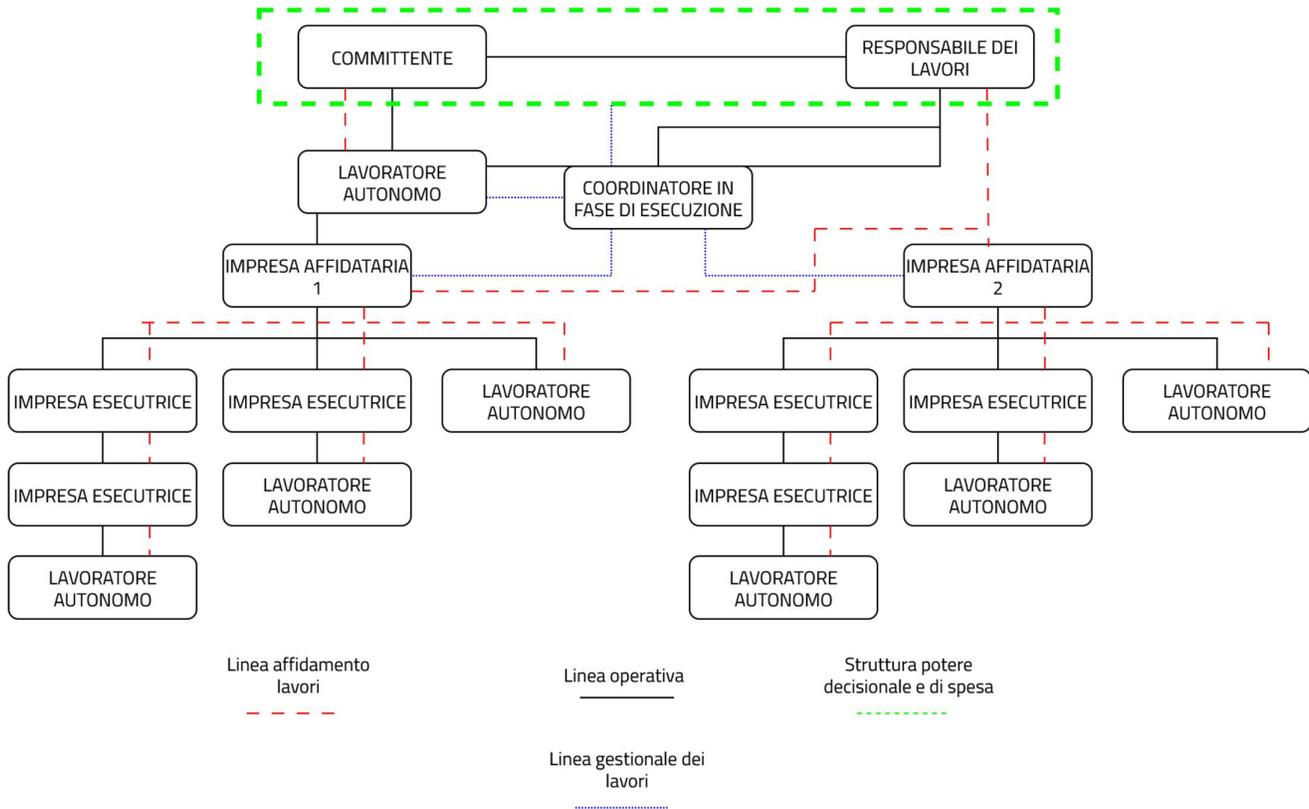

**⚠ ATTENZIONE!**

**PIÙ IMPRESE AFFIDATARIE, MENO SICUREZZA IN CANTIERE!**

**N.B.: QUESTI ORGANIGRAMMI DEVONO ESSERE UTILIZZATI DALL'IMPRESA PER RICONOSCERE IL PROPRIO RUOLO (IMPRESA AFFIDATARIA, IMPRESA ESECUTRICE O LAVORATORE AUTONOMO) RICOPERTO ALL'INTERNO DEL CANTIERE IDENTIFICATO NELLA LISTA N. 1, IN MODO DA INDIVIDUARE CORRETTAMENTE LE LISTE DA COMPILARE SUCCESSIVAMENTE.**

**SCHEDA N. 3A: IMPRESA CON RUOLO DI AFFIDATARIA**

<b>3A: IMPRESA CON RUOLO DI AFFIDATARIA</b>				
Nominativo Datore di Lavoro:				
		si	no	n.a.
È stato individuato il preposto dei lavoratori, dell'impresa affidataria anche esecutrice, presenti in cantiere? (Quando la figura di riferimento, per l'assolvimento dei compiti dell'articolo 97 del D.Lgs. 81/08, non è direttamente ricoperta dal Datore di Lavoro)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono stati individuati i soggetti incaricati di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati nel cantiere?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Formazione idonea per lo svolgimento dell'incarico di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati nel cantiere (almeno uno dei soggetti elencati a destra, deve essere stato incaricato e deve essere idoneamente formato allo scopo)	Datore di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dirigente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Preposto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Altro (specificare):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Formazione del preposto dei lavoratori dell'impresa affidataria anche esecutrice	Generale/specifica + preposti (8 ore) + aggiornamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formazione dei lavoratori dell'impresa affidataria presenti in cantiere	Generale/specifica + aggiornamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Montaggio/smontaggio ponteggi + aggiornamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DPI di 3ª categoria (anti-caduta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'impresa affidataria presenti in cantiere	I lavoratori possiedono l'idoneità sanitaria specifica alla mansione che devono svolgere (valutando eventuali limitazioni per i lavori in quota)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PSC Piano Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza (in presenza di più imprese esecutrici)	È stato realizzato dal Coordinatore per la Sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	È stato trasmesso alle Imprese (esecutrici, familiari) e ai lavoratori autonomi a cui hai affidato i lavori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	È presente in cantiere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Contiene l'analisi del rischio di caduta dall'alto nelle fasi di lavoro in quota, oltre che le misure preventive e protettive per eliminare o ridurre al minimo questo rischio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POS (Piano Operativo Di Sicurezza redatto da tutte le imprese (affidatarie, esecutrici e familiari)	Hai redatto il POS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Contiene i nominativi dei lavoratori autonomi a cui ha affidato i lavori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	È stato redatto da ciascuna impresa (esecutrice, familiare) e contiene i nominativi dei lavoratori autonomi a cui sono stati affidati i lavori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Hai verificato il POS delle imprese a cui ha affidato i lavori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Il coordinatore della sicurezza (CSE) ha verificato il tuo POS e quelli delle imprese a cui ha affidato i lavori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I lavori hanno avuto inizio dopo le verifiche, con esito positivo, dei POS da parte tua o del CSE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	I POS sono presenti in cantiere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	I POS contengono l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e le altre opere provvisorie di notevole importanza utilizzati nel cantiere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	I POS indicano le misure preventive e protettive per eliminare il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria	Possiedi le capacità tecnico-organizzative per eseguire i lavori che ti hanno affidato (capacità organizzativa, adeguata forza lavoro, adeguate macchine ed attrezzature)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Hai dato evidenza di questo al committente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Idoneità tecnico professionale imprese esecutrici o lavoratori autonomi	Hai verificato le capacità tecnico-organizzative dei soggetti a cui hai subappaltato i lavori (imprese o lavoratori autonomi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attività di coordinamento	Vengono effettuate periodicamente riunioni di coordinamento con presenza di tutti i soggetti (coordinatore per la sicurezza, imprese affidatarie, imprese esecutrici, lavoratori autonomi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vengono verbalizzate queste riunioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**SCHEDA N. 3B: IMPRESA CON RUOLO DI ESECUTRICE**

<b>3B: IMPRESA CON RUOLO DI ESECUTRICE</b>						
Nominativo Datore di Lavoro:						
				si	no	n.a.
È stato individuato il preposto nel cantiere (quando non è direttamente il Datore di Lavoro)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Formazione dei preposti	Generale/specifica + preposti (8 ore) + aggiornamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Formazione dei lavoratori	Generale/specifica + aggiornamento (facoltativa per il collaboratori familiari)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Montaggio/smontaggio ponteggi + aggiornamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	DPI di 3ª categoria (anti-caduta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sorveglianza sanitaria	I lavoratori possiedono l' idoneità sanitaria specifica alla mansione che devono svolgere (valutando eventuali limitazioni per i lavori in quota)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento	È stato redatto dal Coordinatore per la Sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Ti è stato trasmesso dall'Impresa che ti ha affidato i lavori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	È presente in cantiere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Contiene l'analisi del rischio di caduta dall'alto nelle fasi di lavoro in quota, oltre che le misure preventive e protettive per eliminare o ridurre al minimo questo rischio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
POS Piano Operativo Di Sicurezza	Hai redatto il POS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Contiene i nominativi dei lavoratori autonomi a cui ha affidato i lavori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	L'hai trasmesso all'impresa affidataria che ti ha affidato i lavori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Il tuo POS è stato verificato dall'impresa affidataria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Il tuo POS è stato verificato dal coordinatore della sicurezza (CSE)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Hai iniziato i dopo che il tuo POS è stato verificato, con esito positivo, da parte sia dell'impresa che ti ha affidato i lavori che da parte del CSE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Il POS è presente in cantiere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

	Il POS contiene l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e le altre opere provvisorie di notevole importanza utilizzati nel cantiere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Il tuo POS indica le misure preventive e protettive per eliminare il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attività di coordinamento	Vengono effettuate periodicamente riunioni di coordinamento con presenza di tutti i soggetti (coordinatore per la sicurezza, imprese affidatarie, imprese esecutrici, lavoratori autonomi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Vengono verbalizzate queste riunioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



**SCHEDA 3C: LAVORATORE AUTONOMO**

<b>3C: RUOLO DI LAVORATORE AUTONOMO (OVVERO IMPRESA INDIVIDUALE SENZA SOCI NÉ LAVORATORI)</b>				
Nominativo Datore di Lavoro:				
		si	no	n.a.
Formazione lavoratore autonomo	Anche se per te è facoltativo, hai effettuato la formazione generale e specifica e i relativi aggiornamenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Hai effettuato la formazione e l'addestramento per l'uso dei DPI di III categoria (anti-caduta)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sorveglianza sanitaria	Anche se per te è facoltativo, hai l'idoneità sanitaria specifica alla mansione che devi svolgere (valutando eventuali limitazioni per i lavori in quota)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Hai idoneità alla mansione nei casi previsti da norme specifiche? (esempio: rischio rumore, vibrazioni, movimentazione manuale di carichi, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)	Se i lavori ti sono stati affidati direttamente dal committente:			
	È stato trasmesso il PSC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	È presente visione del PSC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Il PSC contiene le fasi dettagliate di tutte le lavorazioni in quota?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	In caso di lavori in quota, le fasi critiche (es. montaggio, uso, smontaggio ponteggio) sono presenti e trattate nel PSC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
POS Piano Operativo Di Sicurezza	Se i lavori ti sono stati affidati direttamente da una impresa:			
	Il POS è stato redatto dall'impresa che ti ha affidato i lavori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Hai preso visione del POS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Il POS contiene il tuo nominativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Nel POS sono state individuate le misure preventive e protettive per eliminare il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attività di coordinamento	Vengono effettuate periodicamente riunioni di coordinamento con presenza di tutti i soggetti (coordinatore per la sicurezza, imprese affidatarie, imprese esecutrici, lavoratori autonomi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Vengono verbalizzate queste riunioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**LISTE DI AUTOVALUTAZIONE SPECIFICHE**

***Le successive liste di autovalutazione specifiche sono approfondimenti tecnici delle misure di prevenzione da adottare nel lavoro in quota:***


- ***Uso, montaggio e smontaggio del ponteggio (Allegato 4)***
- ***DPI anti-caduta da utilizzare durante il montaggio del ponteggio (Allegato 5)***
- ***Lista di autovalutazione per il Rischio di caduta dall'alto durante l'uso del ponteggio per il lavoratore Autonomo (Allegato 6)***

ALLEGATO N. 4

SCHEDA 4: RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DURANTE USO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO					
		si	no	n.a.	
Parte da compilare solo per chi esegue il montaggio e smontaggio del ponteggio	PiMUS Piano di Montaggio, uso e smontaggio del ponteggio	È stato redatto da persona esperta/impresa esecutrice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Contiene i disegni esecutivi coerenti con la realizzazione, comprese eventuali modifiche (sovraccarichi per mq, indicazioni degli appoggi, degli ancoraggi, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Contiene la verifica dei piani di appoggio (solai, mensole, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Contiene le modalità di verifica degli elementi durante l'uso (da compilare da parte dell'impresa affidataria)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		È presente in cantiere insieme alla copia del libretto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Progetto (calcolo + disegno esecutivo) del ponteggio in caso di:	Altezza maggiore di 20 metri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Realizzazione difforme agli schemi tipo dell'autorizzazione ministeriale (libretto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ultimo impalcato utilizzato come protezione anti-caduta dalla copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Presenza di reti (anti-polvere, anti-caduta), teli, cartelli pubblicitari...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Presenza di piani di carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Utilizzo promiscuo di elementi con diversa autorizzazione ministeriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		È presente in cantiere il progetto con il disegno che integra il PiMUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Buone pratiche	Viene effettuato, prima di predisporre il PiMUS, un sopralluogo per esaminare gli elementi utili alla realizzazione del ponteggio (caratteristiche piano posa, tipologia ancoraggi, necessità di configurazioni fuori schema, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		È documentato da verbale di sopralluogo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Viene verificato, preliminarmente al montaggio, lo stato di conservazione degli elementi del ponteggio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		È documentato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Viene verificata la correttezza e completezza della documentazione di corredo al ponteggio (PiMUS, progetto, disegno esecutivo, verifica piano di appoggio, calcolo ultimo impalcato se protezione anti-caduta dalla copertura, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	È documentata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gli impalcati	Sono dotati di accesso attraverso idonee scalette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono dotati di parapetto e tavola fermapiede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono dotati di sottoponte di sicurezza (se lavori di durata >5 giorni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono dotati delle diagonali di facciata e di piano (le tavole metalliche sostituiscono le diagonali di piano)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Quelli non pronti per l'uso e incompleti sono delimitati con elementi materiali che ne impediscono l'accesso e opportunamente segnalati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono realizzati con tavole di spessore e resistenza idonea (no assi da getto di carpenteria)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Le tavole assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro (angoli, collegamenti, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'ultimo impalcato utilizzato come protezione anti-caduta dalla copertura	Progetto (calcolo + disegno esecutivo) – vedi PiMUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Altezza montanti dall'ultimo impalcato non minore di 120 cm e dimensionata in funzione dell'altezza di caduta, pendenza e sporgenza del tetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Valutazione necessità di parapetto rinforzato (aumento correnti, rete anticaduta, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La distanza tra gli impalcati e opera in costruzione	Se >20 cm, deve essere prevista la realizzazione di parapetto e tavola fermapiede ovvero di mensole a sbalzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gli appoggi	Garantiscono la stabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Nel caso in cui il ponteggio appoggi su superfici diverse dal suolo: presenza di verifica strutturale capacità portante sufficiente mensole, sporgenze, solai, tetti, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gli ancoraggi	Sono sufficienti (almeno 1 ogni 22 mq, ogni 2 piani, ...) o maggiori secondo indicazioni del calcolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono efficaci, idonei (no filo di ferro), previsti nel libretto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Apparecchi di sollevamento ancorati al ponteggio	Raddoppio montanti (per tutta altezza), rafforzati e controventati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protezione di terzi	Presenza di parasassi/mantovana, delimitazione area al suolo, teli, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le modifiche in corso d'opera	Sono concordate con il coordinatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono concordate con l'impresa affidataria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sono realizzate da impresa con lavoratori idoneamente formati al montaggio / smontaggio / trasformazione del ponteggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La verifica degli elementi ponteggio durante l'uso da parte dell'impresa affidataria	È effettuata secondo le modalità previste nel PiMUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	È effettuata dai soggetti incaricati di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	È documentata e presente in cantiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Viene valutato se la realizzazione del ponteggio è funzionale ai lavori da eseguire (senza rimozione di elementi o modifica dello stesso)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Viene rispettato, durante l'evolversi dei lavori, l'obbligo di non rimuovere elementi del ponteggio (parapetti o altro)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
In caso di necessità, nell'evolversi dei lavori, di modifica del ponteggio viene coinvolto il coordinatore per la sicurezza e l'impresa affidataria?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	




ALLEGATO N. 5

SCHEMA 5: UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTICADUTA		
	si	no
L'utilizzo dei DPI anticaduta è riservato ai lavoratori che hanno ricevuto una formazione e addestramento specifico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'addestramento è documentato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se previsto l'utilizzo dei DPI anticaduta, è valutata la modalità di recupero dei lavoratori in caso di emergenza o soccorso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È documentata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viene verificata periodicamente l'integrità degli elementi che costituiscono il sistema di trattenuta o di arresto-caduta (imbracatura, cordino, dissipatore, dispositivo retrattile, ancoraggio, altro)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È documentata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prima dell'utilizzo dei DPI anticaduta viene valutato il tirante d'aria e la presenza di ostacoli in caso di caduta (sporgenze, balconi, altro)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durante l'utilizzo dei DPI anticaduta è sempre garantita la continuità di aggancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il sistema di sicurezza scelto per il lavoro da eseguire (trattenuta o arresto-caduta) e le modalità di utilizzo dei DPI sono riportati nel POS dell'impresa (o nel PiMUS in caso di montaggio del ponteggio)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ALLEGATO N. 6

<b>SCHEDA 6: RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DURANTE L'USO DEL PONTEGGIO PER IL LAVORATORE AUTONOMO</b>			
		si	no
PiMUS Piano di Montaggio, uso e smontaggio del ponteggio	È presente in cantiere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gli impalcati	Sono dotati di accesso attraverso idonee scalette?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sono dotati di parapetto e tavola fermapiede?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sono dotati di sottoponte di sicurezza (se lavori >5 giorni)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'ultimo impalcato utilizzato come protezione anticaduta dalla copertura	C'è il progetto (calcolo + disegno esecutivo) – vedi PiMUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Altezza montanti dall'ultimo impalcato non minore di 120 cm e dimensionata in funzione dell'altezza di caduta, pendenza e sporgenza del tetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La distanza tra gli impalcati e opera in costruzione	Se >20 cm, deve essere prevista la realizzazione di parapetto e tavola fermapiede ovvero di mensole a sbalzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gli ancoraggi	Sono sufficienti (almeno 1 ogni 22 mq, ogni 2 piani, ...) o maggiori secondo indicazioni del calcolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sono efficaci, idonei (no filo di ferro), previsti nel libretto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>LISTA COMPILATORI DELLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE</b>		
Nominativo	Qualifica	Firma



Data della compilazione \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Titolare dell'Azienda
